

18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 SALUTE

STATO DI ATTUAZIONE- Regione Calabria

Ing. Francesco Tarsia
Referente Unico Regionale per il PNRR M6 della Regione Calabria



Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria@ForumRisk    

www.forummediterraneosanita.it



18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



MISSIONE 6

Il Piano è strutturato in n. 11
linee di investimento

Componente 1

- ▶ 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona
- ▶ 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina -
1.2.2 Centrali Operative Territoriali COT - DEVICE -
INTERCONNESSIONE
- ▶ 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria
intermedia e delle sue strutture (Ospedali di
Comunità)

Componente 2

- ▶ 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
 - ▶ 1.1.1 Digitalizzazione DEAI e II livello.
 - ▶ 1.1.1 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)
 - ▶ 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie
- ▶ 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNRR
- ▶ 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNC
- ▶ 1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la
raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione
 - ▶ 1.3.1 Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni
 - ▶ 1.3.1 Rafforzamento strutturale del SSN "Progetti in essere"
 - ▶ 1.3.2 Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali
- ▶ 2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e
manageriali del personale del sistema sanitario - Borse aggiuntive in
formazione di medicina generale
- ▶ 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e
manageriali del personale del sistema sanitario- Corso di formazione in
infezioni ospedaliere

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it

1		1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona
2	C1	1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT) – DEVICE – INTERCONNESSIONE.
3		1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)
4		1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Investimento 1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello.
5	C2	1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Investimento 1.1.2 – Grandi Apparecchiature Sanitarie
6		1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNRR
7		1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNC
8		1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione. Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali
9		2.2 (a) "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - borse aggiuntive in formazione di medicina generale"
		2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario- borse aggiuntive in formazione di medicina generale
10		1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" (Rafforzamento strutturale del SSN – Interventi in essere)
11		1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione

18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



PNNR
Missione 6
Regione Calabria
Componente 1

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNNR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it



C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona



OBIETTIVI REGIONALI

TARGET MINIMO REGIONALE [57]

TARGET MASSIMO REGIONALE [61]

FABBISOGNO

Il fabbisogno deve essere dettagliato in termini di numero di Case della Comunità (distinte fra da edificare e da ristrutturare) per Ente di riferimento. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascuna Casa della Comunità è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

Ente del SSR	Numero Case della Comunità da edificare	Numero Case della Comunità da ristrutturare	Totale
ASP Cosenza	4	18	22
ASP Catanzaro	1	10	11
ASP Crotona	0	6	6
ASP Vibo Valentia	0	5	5
ASP Reggio Calabria	0	17	17
Totale	5	56	61

IMPORTO ASSEGNATO

Importo assegnato alla Regione dal PNRR: € 84.677.262,22

Importo degli interventi a valere su risorse PNRR: € 84.677.260,00

Importo integrativo regionale (DGR 174/2022) per efficientamento energetico: € 5.885.518,00

Importo integrativo regionale (DGR 174/2022) per nuovi interventi: € 6.000.000,00

18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



Forum Mediterraneo in Sanità™ 2024

C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona



CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità	T2 2022	🇮🇹
Target	Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità	T1 2023	🇮🇹
Target	Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte)	T1 2023	🇮🇹
Target	Stipula dei contratti per la realizzazione delle Case di Comunità	T3 2023	🇮🇹
Target	Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	T1 2026	🇪🇺

GANTT

Linee di attività	2022				2023				2024				2025				2026			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1. Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità	🇮🇹																			
2. Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità					🇮🇹															
3. Definire, con apposito atto normativo, la programmazione della rete assistenziale territoriale in coerenza con standard e modelli organizzativi definiti nella Riforma dell'Assistenza Territoriale																				
4. Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte)									🇮🇹											
5. Stipula dei contratti per la realizzazione delle Case di Comunità																				
6. Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche																				🇪🇺

🇮🇹 MultiTarget
🇪🇺 MultiTarget

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it



18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



Forum Mediterraneo in Sanità™ 2024

C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

CATANZARO



STATO DI ATTUAZIONE

#	N. Piano	CUP	ENTE del SSR	VUB/SPOKE	COMUNE	PROVINCIA	IMPORTO TOTALE €	Stato di attuazione	
								Livello della progettazione consultato al 15 - AGO - 2024	Stato esecuzione lavori al 15 - AGO - 2024
1	9	E39F22000430006	ASP CATANZARO	USB	SOVERATO	CZ	2.314.099,00	■	●
2	11	E38822000130006	ASP CATANZARO	SPOKE	TRIVERIA	CZ	1.550.808,00	■	●
3	7	F18872000140006	ASP CATANZARO	SPOKE	SAN MARINO (SQUARRO)	CT	1.610.981,00	■	●
4	4	F48922000100006	ASP CATANZARO	SPOKE	LIBINCA	CT	1.890.545,00	■	●
5	8	E58822000180006	ASP CATANZARO	SPOKE	SERSALE	CZ	1.856.731,00	■	●
6	2	E44E22000070006	ASP CATANZARO	SPOKE	CATANZARO	CZ	784.773,00	■	●
7	3	E68822000140006	ASP CATANZARO	SPOKE	CATANZARO	CZ	1.423.615,00	■	●
8	6	E75F22000740006	ASP CATANZARO	SPOKE	RELLIA TERRESE	CZ	1.500.000,00	■	●
9	10	E88822000140006	ASP CATANZARO	SPOKE	SQUILLACE	CZ	1.875.905,00	■	●
10	5	E88822000150006	ASP CATANZARO	SPOKE	LAMEZIA TERME	CZ	2.029.137,00	■	●
11	1	E98822000060006	ASP CATANZARO	SPOKE	BRULLATO	CZ	15.102.263,00	■	●



Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it



18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



Forum Mediterraneo in Sanità™ 2024

C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

STATO DI ATTUAZIONE



COSENZA



Stato di Attuazione Fasi di Progetto												
#	N. Piano	CUP	ENTE del SSR	UR/ SPOKE	COMUNE	PROVINCIA	IMPORTO TOTALE €	Livello della progettazione consolidata al 15 - AGO - 2024	Stato contratto	Stato esecuzione lavori al 15 - AGO - 2024		
1	15	B12LZ2000180001	ASP COSENZA	URH	CASSANO ALLIUNO	CS	1.742.264,00	■	●	📊		
2	18	B12C22000200001	ASP COSENZA	USB	CROSA	CS	1.571.132,00	■	●	📊		
3	23	B23C22000200001	ASP COSENZA	SPOKE	MORMANO	CS	1.400.000,00	■	●	📊		
4	20	B22C22000300001	ASP COSENZA	SPOKE	SCALEA	CS	1.400.000,00	■	●	📊		
5	14	B22C22000310001	ASP COSENZA	SPOKE	CASALI DEL MANICO	CS	1.400.000,00	■	●	📊		
6	24	B22C22000330001	ASP COSENZA	SPOKE	PARENTI	CS	1.400.000,00	■	●	📊		
7	25	B29F22000410001	ASP COSENZA	URH	RENDE	CS	1.827.880,00	■	●	📊		
8	26	B32C22000400001	ASP COSENZA	SPOKE	ROCCA IMPERIALE	CS	1.400.000,00	■	●	📊		
9	31	B32C22000440001	ASP COSENZA	SPOKE	TORIANO CASTELLO	CS	1.400.000,00	■	●	📊		
10	16	B32C22000840001	ASP COSENZA	SPOKE	CETINARO	CS	1.500.000,00	■	●	📊		
11	27	B42C22000310001	ASP COSENZA	USB	ROSSIGNANO GRAVINA	CS	1.656.698,00	■	●	📊		
12	10	B42C22000320001	ASP COSENZA	SPOKE	LONGOBUCCO	CS	1.400.000,00	■	●	📊		
13	20	B52C22000170001	ASP COSENZA	SPOKE	LUNGRO	CS	1.400.000,00	■	●	📊		
14	21	B62C22000210001	ASP COSENZA	SPOKE	LUZZI	CS	1.400.000,00	■	●	📊		
15	13	B72C22000250001	ASP COSENZA	SPOKE	BISIGNANO	CS	1.400.000,00	■	●	📊		
16	30	B72C22000260001	ASP COSENZA	SPOKE	SPEZZANO DELLA SILA	CS	1.400.000,00	■	●	📊		
17	22	B82C22000250001	ASP COSENZA	SPOKE	MONTALTO LUFFUGO	CS	1.400.000,00	■	●	📊		
18	17	B82C22000260001	ASP COSENZA	USB	COSENZA	CS	1.742.264,00	■	●	📊		
19	32	B82C22000280001	ASP COSENZA	SPOKE	VERBICARO	CS	1.400.000,00	■	●	📊		
20	12	B92C22000240001	ASP COSENZA	USB	AMANTEA	CS	1.656.698,00	■	●	📊		
21	33	B92C22000250001	ASP COSENZA	SPOKE	VILLAPANA	CS	1.400.000,00	■	●	📊		
22	28	B92C22000260001	ASP COSENZA	SPOKE	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	1.400.000,00	■	●	📊		

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it



18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



Forum Mediterraneo in Sanità™ 2024

C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona



CROTONE

STATO DI ATTUAZIONE

#	N. Piano	CUP	ENTE DEL SSR	UR/COMUNE	COMUNE	PROVINCIA	Stato di Attuazione Fase di Progetto			
							IMPORTO TOTALE €	Livello della progettazione consolidata al 15 - AGO - 2024	Stato controllo	Stato esecuzione lavori al 15 - AGO - 2024
1	38	E12C22000180005	ASP CROTONE	SPODE	ROCCA DI NETO	VR	1.400.000,00	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>
2	36	E12C22000300005	ASP CROTONE	USB	CROTONE	VR	1.827.800,00	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>
3	34	E22C22000240005	ASP CROTONE	SPODE	CARCURI	VR	1.500.000,00	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>
4	37	E42C22000500005	ASP CROTONE	SPODE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	VR	1.400.000,00	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>
5	35	E82C22000800005	ASP CROTONE	SPODE	CIRO MASINA	VR	1.400.000,00	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>
6	39	E92C22000100005	ASP CROTONE	SPODE	VERZINO	VR	1.400.000,00	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>

VIBO VALENTIA



#	N. Piano	CUP	ENTE DEL SSR	UR/COMUNE	COMUNE	PROVINCIA	Stato di Attuazione Fase di Progetto			
							IMPORTO TOTALE €	Livello della progettazione consolidata al 15 - AGO - 2024	Stato controllo	Stato esecuzione lavori al 15 - AGO - 2024
1	60	I32C22000560006	ASP VIBO VALENTIA	SPODE	SERRA SAN BRUNO	VV	1.400.000,00	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>
2	57	I44Z22003370005	ASP VIBO VALENTIA	SPODE	FLADELITA	VV	1.513.915,00	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>
3	58	I51L22000440001	ASP VIBO VALENTIA	SPODE	MILITO	VV	1.400.000,00	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>
4	61	I62C22000530005	ASP VIBO VALENTIA	USB	SORIANO CALABRO	VV	1.400.000,00	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>
5	59	I61L22000640006	ASP VIBO VALENTIA	USB	MEOTIARA	VV	1.613.915,00	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it



18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



Forum Mediterraneo in Sanità™ 2024

C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

REGGIO CALABRIA

STATO DI ATTUAZIONE



N. Piano	CUP	ENTE ASL	US/USP/USP	COMUN	PROVINCIA	IMPORTO TOTALE €	Quantità della progettazione consolidata al 11.09.2024	Stato Contratti	Stato esecuzione lavori al 11.09.2024
1	013C21001270008	ASP REGGIO CALABRIA	SPONE	MONASTERRACE	RC	1.701.145,00	■	●	◐
2	013C21001200005	ASP REGGIO CALABRIA	USP	CALIGNA	RC	1.638.317,00	■	●	◐
3	013C21001200001	ASP REGGIO CALABRIA	SPONE	BAGNARA CALABRIA	RC	1.481.885,00	■	●	◐
4	023C21000820001	ASP REGGIO CALABRIA	SPONE	MONTABELLO EMICO	RC	1.610.944,00	■	●	◐
5	038G21001140001	ASP REGGIO CALABRIA	SPONE	SANT'ALFONSO IN ACROBOLIMONTI	RC	1.896.473,00	■	●	◐
6	037821008620001	ASP REGGIO CALABRIA	SPONE	CINQUEFRONDI	RC	1.407.463,00	■	●	◐
7	030721001210004	ASP REGGIO CALABRIA	SPONE	SANT'ALFONSO IN ACROBOLIMONTI	RC	2.198.791,00	■	●	◐
8	043C21001240001	ASP REGGIO CALABRIA	USP	FRIGGIOLI CALABRIA	RC	1.498.875,00	■	●	◐
9	030C21001230008	ASP REGGIO CALABRIA	USP	REGGIO DI CALABRIA	RC	2.728.236,00	■	●	◐
10	043C21000880001	ASP REGGIO CALABRIA	SPONE	BOVALINO	RC	1.497.169,00	■	●	◐
11	030C21000862001	ASP REGGIO CALABRIA	SPONE	TRUZZANOVA	RC	1.497.463,00	■	●	◐
12	060C21000990001	ASP REGGIO CALABRIA	USP	PIA' M.	RC	2.198.791,00	■	●	◐
13	030C21000800001	ASP REGGIO CALABRIA	SPONE	GIROCA ONICA	RC	1.497.463,00	■	●	◐
14	070720000900001	ASP REGGIO CALABRIA	SPONE	ANTONIMMA	RC	1.500.000,00	■	●	◐
15	030C21001100001	ASP REGGIO CALABRIA	SPONE	ROGUDI	RC	1.406.419,00	■	●	◐
16	030C21000830001	ASP REGGIO CALABRIA	SPONE	ROSMARO	RC	1.331.943,00	■	●	◐
17	043C21000840001	ASP REGGIO CALABRIA	SPONE	VILLA VENEZIA	RC	1.498.180,00	■	●	◐

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria


@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it



**C1 - 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina -
1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT) - LAVORI**

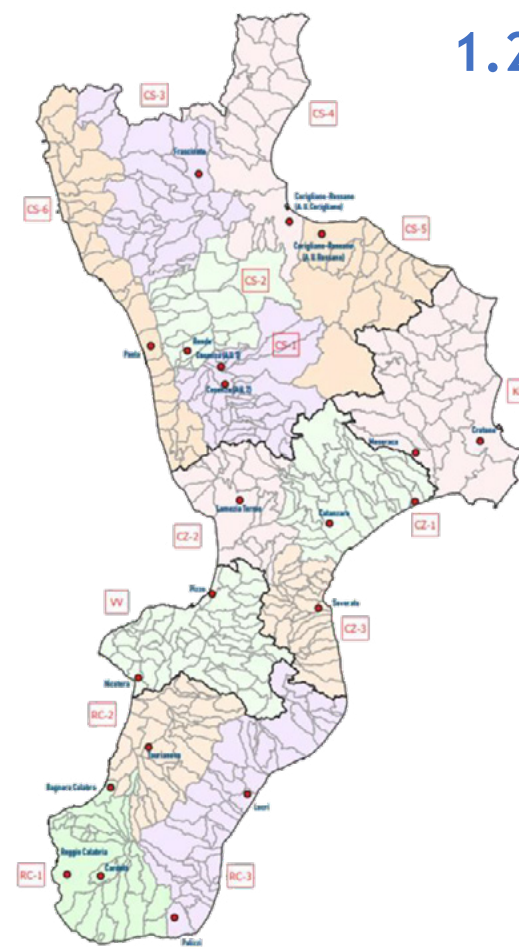

OBIETTIVI REGIONALI

Ente del SSR	Numero di COT
ASP Cosenza	7
ASP Catanzaro	4
ASP Crotona	2
ASP Vibo Valentia	2
ASP Reggio Calabria	6
Totale	21

IMPORTO ASSEGNATO
Importo complessivo interventi sugli immobili COT di € 4.122.179,00
Fondi statali PNRR: € 3.285.079,00
Fondi regionali PSC: € 837.100,00
Target Minimo: 19
Target Massimo: 21

Importo complessivo interventi per interconnessione COT di € 1.500.349,00
Fondi statali PNRR: € 1.350.349,00
Fondi regionali PSC: € 150.000,00
Target Minimo: 5
Target Massimo: 5

Importo complessivo interventi per device COT di € 2.037.498,20
Fondi statali PNRR: € 1.837.594,86
Fondi regionali PSC: € 199.903,34
Target Minimo: 5
Target Massimo: 5

**TOTALE:23
LOADING ...**

**È in corso la richiesta di
rimodulazione**


Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it

**C1 - 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina -
 1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT) - LAVORI**

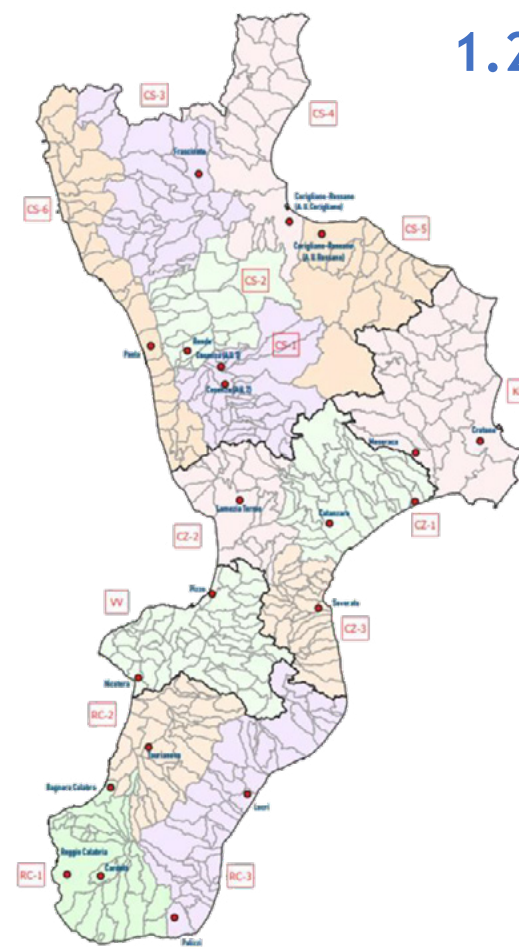

REGIONE CALABRIA	
Azienda	Comune
ASP CATANZARO	BOTRICELLO
ASP CATANZARO	CATANZARO
ASP CATANZARO	LAMEZIA TERME
ASP CATANZARO	SOVERATO
ASP COSENZA	CASTROVILLARI
ASP COSENZA	CORIGLIANO CALABRO
ASP COSENZA	CORIGLIANO-ROSSANO
ASP COSENZA	COSENZA
ASP COSENZA	COSENZA
ASP COSENZA	PAOLA
ASP COSENZA	RENDE
ASP CROTONE	CROTONE
ASP CROTONE	MESORACA
ASP REGGIO CALABRIA	BAGNARA CALABRA
ASP REGGIO CALABRIA	CARDETO
ASP REGGIO CALABRIA	LOCRI
ASP REGGIO CALABRIA	PALIZZI
ASP REGGIO CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA
ASP REGGIO CALABRIA	TAURIANOVA
ASP VIBO VALENTIA	NICOTERA
ASP VIBO VALENTIA	PIZZO

Girifalco e Chiaravalle

LOADING ...



Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk




www.forummediterraneosanita.it

18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



Forum Mediterraneo in Sanità™ 2024

C1 - 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT) - LAVORI

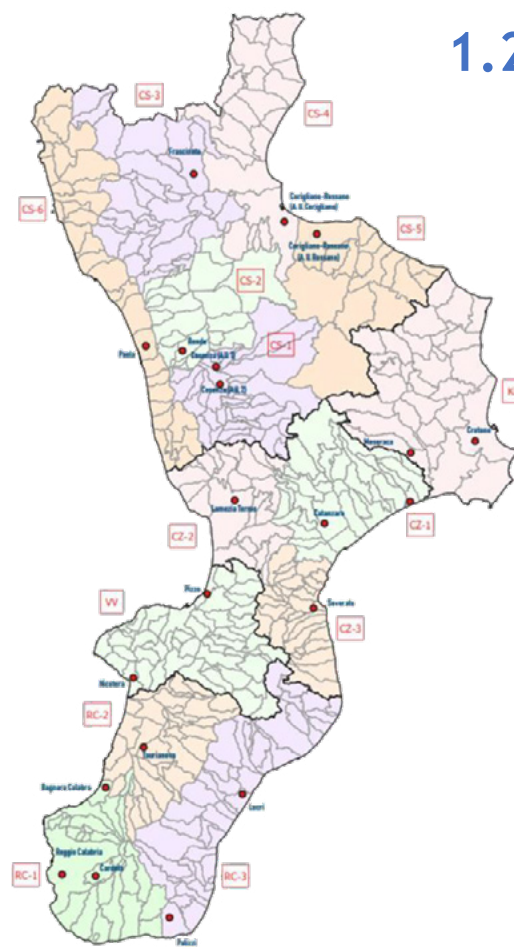

CRONOPROGRAMMA				
MILESTONE & TARGET				
Milestone/Target	Descrizione	Termini di esecuzione Regionale	Rilevanza ITALIA	
Target	Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	T2 2022	▶	
Target	Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per l'interconnessione aziendale	T2 2022	▶	
Target	Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara per l'implementazione delle Centrali Operative Territoriali	T4 2022	▶	
Target	Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	T4 2022	▶	
Target	Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per l'interconnessione aziendale	T4 2022	▶	
Target	Stipula dei contratti per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	T2 2023	▶	
Target	Stipula dei contratti per l'interconnessione aziendale	T2 2023	▶	
Target	Centrali operative pienamente funzionanti	T1 2024	▶	
Target	Completamento interventi per interconnessione aziendale	T1 2024	▶	

GANTT					
Linea di attività	2022	2023	2024	2025	2026
1	Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	▶			
2	Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per l'interconnessione aziendale	▶			
3	Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara per l'implementazione delle Centrali Operative Territoriali	▶			
4	Definizione, con apposito atto normativo, la programmazione della rete assistenziale territoriale in coerenza con i mandati e modelli organizzativi definiti nella riforma dell'Assistenza Territoriale	▶			
5	Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	▶			
6	Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per l'interconnessione aziendale	▶			
7	Stipula dei contratti per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	▶			
8	Stipula dei contratti per l'interconnessione aziendale	▶			
9	Centrali operative pienamente funzionanti		▶		
10	Completamento del numero target di interventi per l'interconnessione aziendale		▶		

Tenuto conto delle difficoltà registrate in fase di affidamento e sviluppo della progettazione e di affidamento ed esecuzione dei lavori è stata proposta ed è in corso di approvazione, la rimodulazione del termine finale di entrata in esercizio delle COT. Il nuovo termine per l'entrata in funzione delle Centrali Operative Territoriali, è stato pertanto differito da T1 2024 a T3 2024

Linea di attività	2022	2023	2024	2025	2026
1	Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	▶			
2	Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per l'interconnessione aziendale	▶			
3	Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara per l'implementazione delle Centrali Operative Territoriali	▶			
4	Definizione, con apposito atto normativo, la programmazione della rete assistenziale territoriale in coerenza con i mandati e modelli organizzativi definiti nella riforma dell'Assistenza Territoriale	▶			
5	Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	▶			
6	Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per l'interconnessione aziendale	▶			
7	Stipula dei contratti per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	▶			
8	Stipula dei contratti per l'interconnessione aziendale	▶			
9	Centrali operative pienamente funzionanti		▶		
10	Completamento del numero target di interventi per l'interconnessione aziendale		▶		

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it




18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



Forum Mediterraneo in Sanità™ 2024


C1 - 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT) - LAVORI

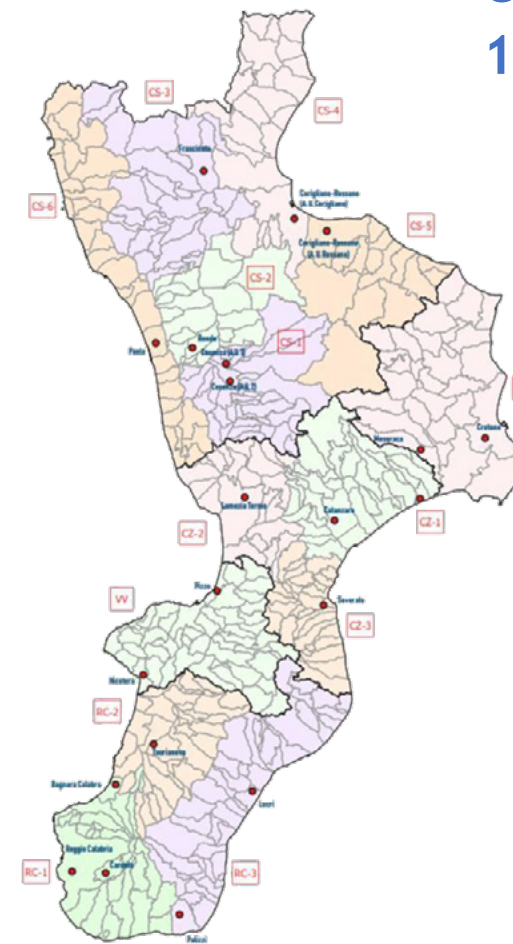

Stato di Situazione Fasi di Progetto													
#	Id. Piano	CUP	ENTE del SSR	US/SPRE	COMUNE	PROVINCIA	IMPORTO TOTALE €	Livello della progettazione consentita al 15-AGO-2024	Stato contratto	Stato esecuzione lavori al 15-AGO-2024			
1	72	832C2200030001	ASP COSENZA	LAV	RENDE	CS	173.075,00	■	●	📊	■	●	📊
2	68	832C2200041001	ASP COSENZA	LAV	CORIGLIANO-ROSSANO	CS	173.075,00	■	●	📊	■	●	📊
3	67	832C2200042001	ASP COSENZA	LAV	LEONARDO CALABRO	CS	173.075,00	■	●	📊	■	●	📊
4	64	832C2200078001	ASP TORRENOVA	LAV	CARTONI LIGURI	CS	173.075,00	■	●	📊	■	●	📊
5	69	880C2200039001	ASP COSENZA	LAV	COSENZA	CS	173.075,00	■	●	📊	■	●	📊
6	70	880C2200031001	ASP COSENZA	LAV	COSENZA	CS	173.075,00	■	●	📊	■	●	📊
7	71	880C2200038001	ASP COSENZA	LAV	PAOLA	CS	173.075,00	■	●	📊	■	●	📊
8	73	813C2200019000	ASP CROTONE	LAV	CROTONE	KR	173.075,00	■	●	📊	■	●	📊
9	65	839F2200040006	ASP LAMEZIA	LAV	SORIANO	LC	421.182,00	■	●	📊	■	●	📊
10	62	8148F2200038006	ASP CATANZARO	LAV	BOTICELLO	CZ	414.068,00	■	●	📊	■	●	📊
11	74	8148F2200038006	ASP CATANZARO	LAV	BOTICELLO	CZ	414.068,00	■	●	📊	■	●	📊
12	63	822F2200052000	ASP CATANZARO	LAV	CATANZARO	CZ	173.075,00	■	●	📊	■	●	📊
13	64	880F2200053000	ASP CATANZARO	LAV	LAMBITA TERME	CZ	173.075,00	■	●	📊	■	●	📊
14	77	812C2100130001	ASP REGGIO CALABRIA	LAV	USUR	RC	145.100,00	■	●	📊	■	●	📊
15	75	812C2100131001	ASP REGGIO CALABRIA	LAV	BRACONIA CALABRIA	RC	145.100,00	■	●	📊	■	●	📊
16	79	832C2100120001	ASP REGGIO CALABRIA	LAV	REGGIO DI CALABRIA	RC	135.434,00	■	●	📊	■	●	📊
17	76	8148F2200038006	ASP REGGIO CALABRIA	LAV	REGGIO DI CALABRIA	RC	414.068,00	■	●	📊	■	●	📊
18	80	822C2100007001	ASP REGGIO CALABRIA	LAV	TALIANOVA	RC	145.100,00	■	●	📊	■	●	📊
19	78	812L2200700001	ASP REGGIO CALABRIA	LAV	GRONTO	RC	145.100,00	■	●	📊	■	●	📊
20	82	81822000910006	ASP VIBO VALENTIA	LAV	PEZZO	VV	173.075,00	■	●	📊	■	●	📊
21	81	8182F22000910006	ASP VIBO VALENTIA	LAV	PEZZO	VV	173.075,00	■	●	📊	■	●	📊

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria@ForumRisk  www.forummediterraneosanita.it

C1 - 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - Centrali Operative Territoriali (COT) - INTERCONNESSIONE

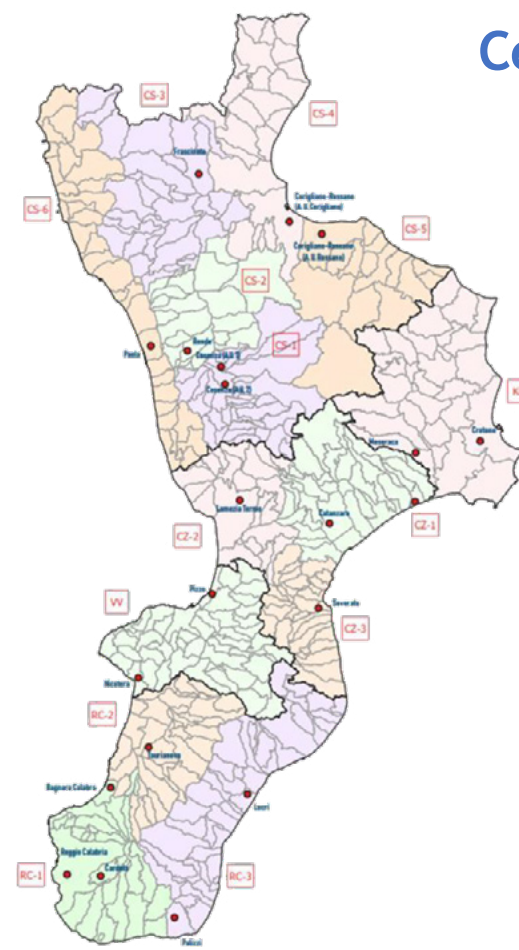

La Regione Calabria, relativamente alla sub misura M6C1 1.2.2.2 - Casa come primo luogo di cura e Telemedicina - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) - Interconnessione aziendale, ha realizzato una **unica progettualità di interconnessione** coinvolgendo le 5 ASP che realizzeranno le 21 Centrali operative territoriali finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il modello COT regionale prevede l'implementazione di **un sistema informatico, cloud, unificato a livello regionale** in termini di logica applicativa, ma **segmentato a livello aziendale** per la gestione e l'archiviazione delle informazioni, favorendo economie di scala e l'interoperabilità delle COT a livello aziendale e regionale.

L'architettura tiene conto della Progettazione Armonica del **Nuovo Ecosistema Sistema Sanitario** che coinvolge tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e tutti i servizi Socio/Sanitari di accesso ed accoglienza, che sono in fase di progettazione e di prossima attivazione in Regione Calabria.



Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk




www.forummediterraneosanita.it

18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI

Forum
Mediterraneo
in Sanità™ 2024

C1 - 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - Centrali Operative Territoriali (COT) - INTERCONNESSIONE

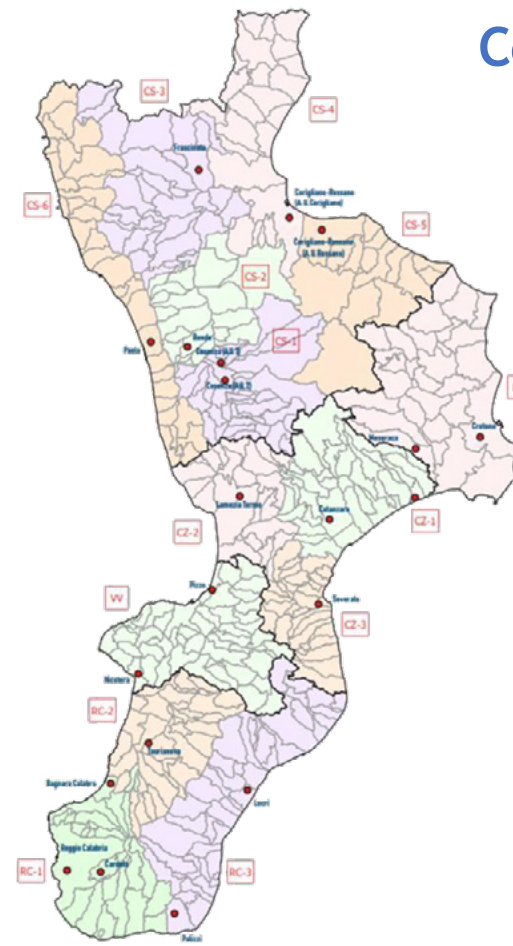

Modalità di approvvigionamento

La normativa prevede che gli acquisti in ambito ICT siano effettuati prevalentemente, salvo casi specifici e definitivi dal Codice degli appalti, attraverso l'utilizzo dello strumento delle Convenzioni Consip disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione.

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono previste alcune specifiche convenzioni per l'implementazione, la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi, attraverso gli strumenti degli Accordi Quadro CONSIP:

- **Sanità Digitale 2 Servizi applicativi in ambito Sanità Digitale - sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino**
- **Centrali Telefoniche 8**

Perimetro economico

	importo AQ CT8	importo AQ Sanità Digitale	Totale
ASP CS	126.900,30 €	440.596,70 €	567.497,00 €
ASP KR	32.678,74 €	113.392,26 €	146.071,00 €
ASP CZ	63.013,82 €	221.270,18 €	284.284,00 €
ASP VV	32.678,737 €	113.392,26 €	146.071,00 €
ASP RC	95.254,07 €	33.1171,92 €	426.426,00 €
Totale			1.570.349,00 €

La piattaforma applicativa COT dovrà:
1 Collegare le COT della stessa provincia ASP
2 Interconnettere Tutte le COT della regione (Vs. 116/117)
3 Essere Interoperabile e/o interconnesso con Applicativi Regionali (es. Sovra CUP, Telemedicina regionale, anagrafe, NUE)
4 Essere integrabile con un SET minimale di Applicazioni Sanitarie Aziendali
5 Essere istanziata su Piattaforma Cloud per poi migrare su PSN

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk




www.forummediterraneosanita.it



C1 - 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)


OBIETTIVI REGIONALI

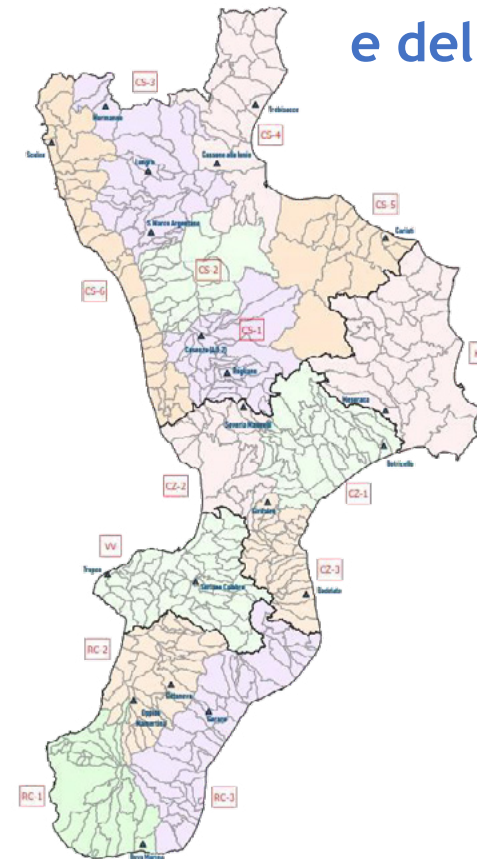

Ente del SSR	Numero Ospedali di Comunità da edificare	Numero Ospedali di Comunità da riconvertire	Totale
ASP Cosenza	0	9	9
ASP Catanzaro	1	3	4
ASP Crotona	0	1	1
ASP Vibo Valentia	0	2	2
ASP Reggio Calabria	0	4	4
Totale	1	19	20

IMPORTO ASSEGNATO
Importo complessivo di € 52.710.023,00
Fondi statali PNRR: € 37.631.958,00
Fondi regionali PSC: € 15.078.065,00
Target Minimo: 15
Target Massimo: 20

C1 - 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

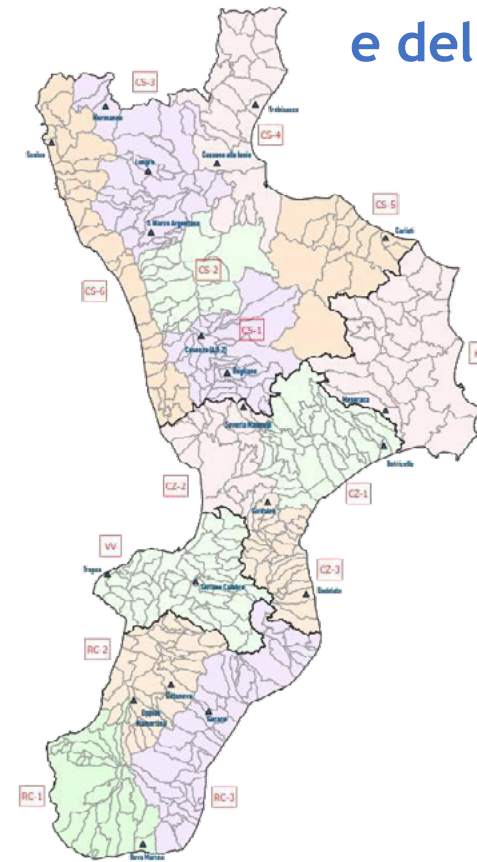

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T2 2022	🇪🇺
Target	Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T1 2023	🇪🇺
Target	Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T1 2023	🇪🇺
Target	Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T3 2023	🇪🇺
Target	Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	T1 2026	🇪🇺

GANIT


Linee di attività	2022			2023			2024			2025			2026			
	11	12	13	14	11	12	13	14	11	12	13	14	11	12	13	14
1. Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	🇪🇺															
2. Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità					🇪🇺											
3. Definire, con apposito atto normativo, la programmazione della rete assistenziale territoriale in coerenza con standard e modelli organizzativi definiti nella Regione dell'Assistenza Territoriale																
4. Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità						🇪🇺										
5. Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità																
6. Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche																🇪🇺

18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



Forum Mediterraneo in Sanità™ 2024

C1 - 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

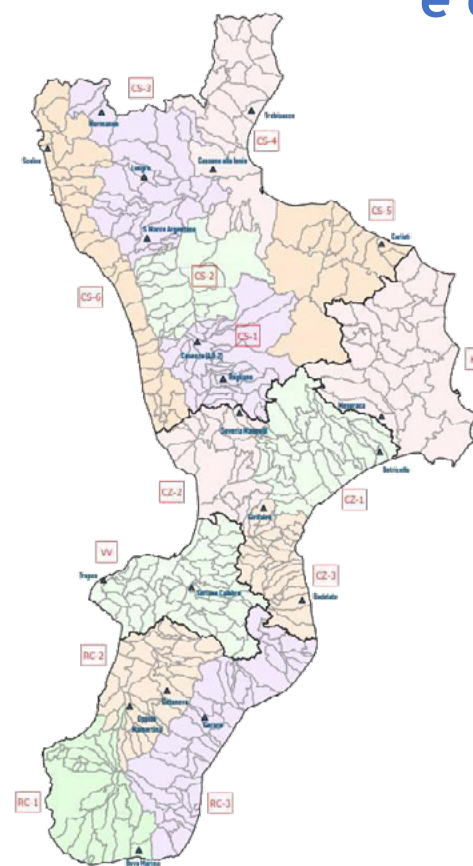

STATO DI ATTUAZIONE

N. Piano	CSP	ENTE AMMINISTRATIVO	COMUNE	PROVINCIA	IMPORTO TOTALE €	Livello della progettazione consolidato al 15/09/2024	Stato contrattato	Stato esecuzione lavori al 15/09/2024	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	813C22000210001	ASP COSENZA	CASSANO ALL'IONIO	CS	2.508.956,00	■	●	▬	11	96	8482200000006	ASP CATANZARO	SOVERA MANFREDI	CZ	2.600.997,00	■	●	▬
2	813C22000340001	ASP COSENZA	MORMANO	CS	2.508.956,00	■	●	▬	12	96	8482200000006	ASP CATANZARO	GARRALDO	CZ	2.976.989,00	■	●	▬
4	813C22000140001	ASP COSENZA	NETTA	CS	2.508.956,00	■	●	▬	13	96	8482200000006	ASP CATANZARO	BACOLI ARIO	CZ	3.400.000,00	■	●	▬
4	813C22000100001	ASP COSENZA	ROGLIANO	CS	2.508.956,00	■	●	▬	14	106	813C22000100005	ASP CATANZARO	MESORACA	MR	2.508.956,00	■	●	▬
5	813C22000200001	ASP COSENZA	LUNIGRO	CS	2.508.956,00	■	●	▬	15	108	8482200000006	ASP CATANZARO	OTTANOVA	RC	2.305.613,00	■	●	▬
6	813C22000210001	ASP COSENZA	SAN MARCO ARGENTANO	CS	2.508.956,00	■	●	▬	16	110	8482200000006	ASP CATANZARO	OSIRIO MARINELLA	RC	2.321.756,00	■	●	▬
7	813C22000720001	ASP COSENZA	TREBISACCE	CS	2.500.000,00	■	●	▬	17	100	8482200000006	ASP CATANZARO	GETTOLE	RC	2.642.261,00	■	●	▬
8	813C22000720001	ASP COSENZA	CARATI	CS	2.500.000,00	■	●	▬	18	107	8482200000006	ASP CATANZARO	BOVA MARINA	RC	2.718.867,00	■	●	▬
14	813C22000140001	ASP COSENZA	NETTA	CS	2.508.956,00	■	●	▬	19	117	8482200000006	ASP CATANZARO	TRONIA	VV	3.400.000,00	■	●	▬
10	848220000100006	ASP CATANZARO	BOTTICELLO	CZ	3.618.974,00	■	●	▬	20	111	848220000100006	ASP CATANZARO	SORIANO CALABRO	VV	3.387.080,00	■	●	▬

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk




www.forummediterraneosanita.it



18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI

 **Forum
Mediterraneo
in Sanità™ 2024**

PNNR
Missione 6
Regione Calabria
Componente 2

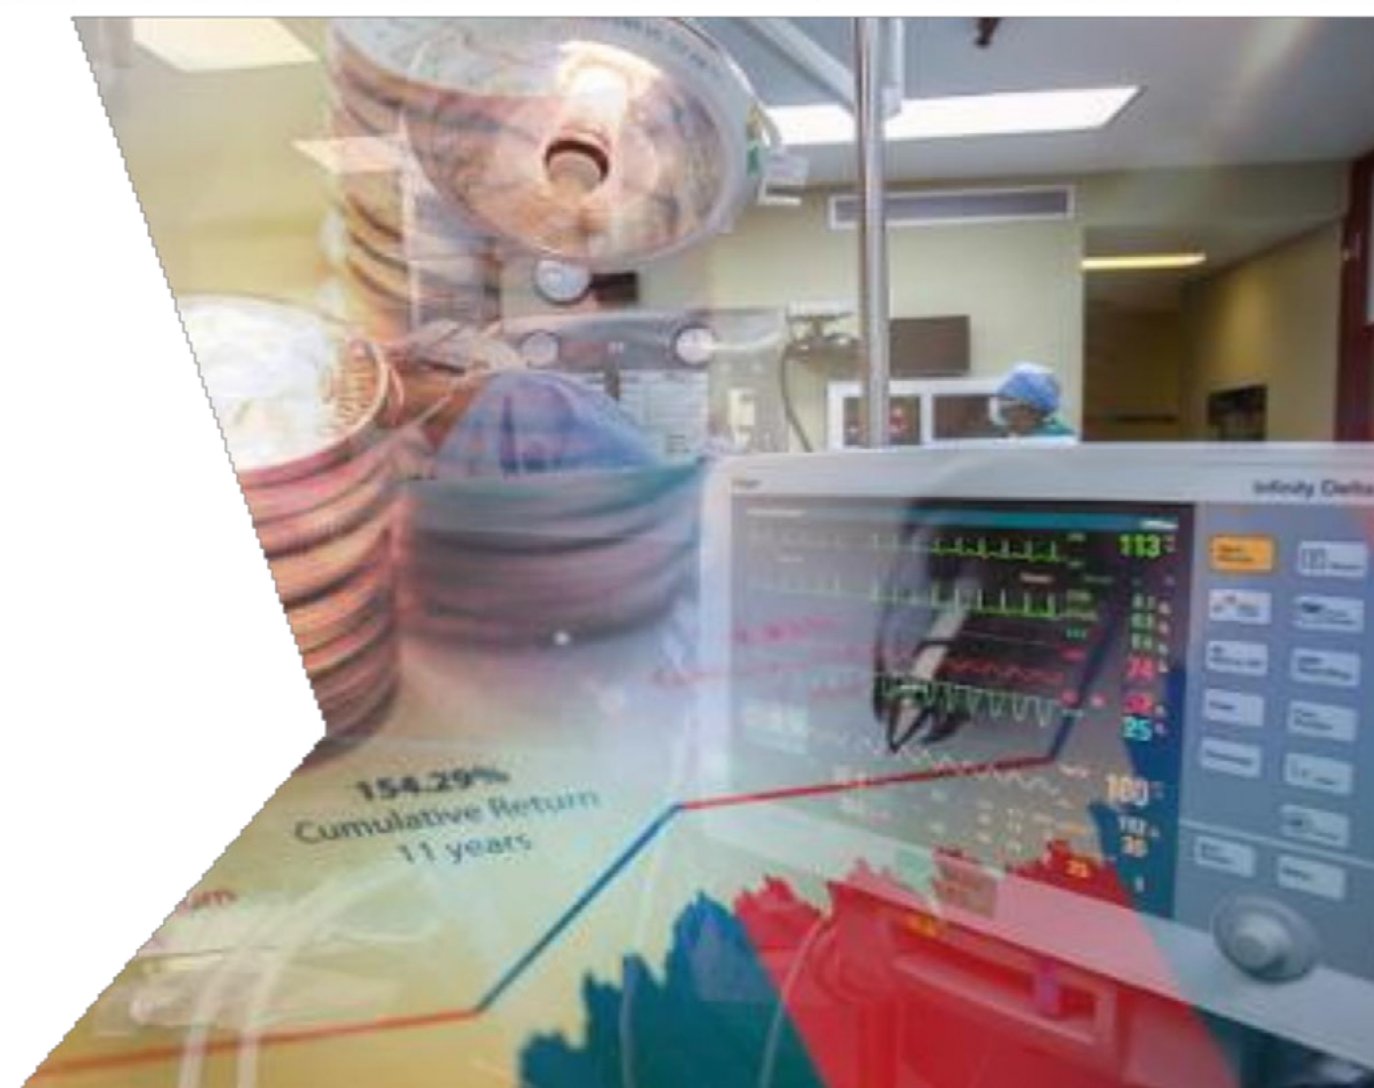

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it

18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



Forum Mediterraneo in Sanità™ 2024

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II livello

OBIETTIVI REGIONALI

ENTE del SSR	Titolo Progetto	Presidio ospedaliero	DEA I o II Livello	Comune
ASP COSENZA	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEA I LIVELLO DELLO SPOKE DI ROSSANO CORIGLIANO	P.O. CORIGLIANO/ROSSANO	DEA I	CORIGLIANO/ROSSANO
ASP COSENZA	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEA I LIVELLO DELLO SPOKE DI CASTROVILLARI	P.O. PAOLA/CETRARO	DEA I	PAOLA/CETRARO
ASP COSENZA	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEA I LIVELLO SPOKE PAOLA-CETRARO	P.O. CASTROVILLARI	DEA I	CASTROVILLARI
ASP CROTONE	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO OSPEDALIERO DEL PO DI CROTONE	OSPEDALE DI CROTONE	DEA I	CROTONE
ASP CATANZARO	AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO	PO LAMEZIA TERME	DEA I	LAMEZIA TERME
ASP VIBO VALENTIA	IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE	P.O. VIBO VALENTIA	DEA I	VIBO VALENTIA
ASP REGGIO CALABRIA	PNRR INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIGITALIZZAZIONE DEL DEA DI I° LIVELLO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LOCRI (RC)	P.O. LOCRI	DEA I	LOCRI
ASP REGGIO CALABRIA	PNRR INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIGITALIZZAZIONE DEL DEA DI I° LIVELLO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LOCRI (RC)	P.O. POLISTENA	DEA I	POLISTENA
AO "ANNUNZIATA" COSENZA	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO OSPEDALIERO	ANNUNZIATA/S.BARBARA/MARIANO SANTO	DEA II	COSENZA
AO "PUGLIESE-CIACCIÒ" CATANZARO /AOU "MATER DOMINI"	AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO	PO "PUGLIESE" /PO GERMANETO E UFFICI AMMINISTRATIVI	DEA II	CATANZARO
G.O.M. "BIANCHI-MELACRINO-MORELLI" REGGIO CALABRIA	SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI DEL GOM BIANCHI MELACRINO MORELLI DI REGGIO CALABRIA	P.O. G.O.M. "BIANCHI-MELACRINO-MORELLI" REGGIO CALABRIA	DEA II	REGGIO CALABRIA

IMPORTO ASSEGNATO

Importo assegnato alla regione dal PNRR: € 54.573.930,99
 Importo degli interventi a valere su risorse PNRR: € 54.573.930,43

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it



18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



Forum Mediterraneo in Sanità™ 2024

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II livello

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello) (*).	T4 2022	◆
Target	Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione -Livello I e II)	T3 2025	◆

(* La milestone è relativa alle gare Consip

GANTT

Linee di attività	2022			2023			2024			2025			2026		
	T1	T2	T4	T1	T2	T4	T1	T2	T4	T1	T2	T4	T1	T2	T4
1. Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici - Consip (*) Pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello).			◆												
2. Completamento prima fase di interventi (impiego del 75% del finanziamento)															
3. Completamento seconda fase di interventi (impiego del 25% del finanziamento)															
4. Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione -Livello I e II)															

*La milestone è relativa alle gare Consip



Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it

18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI

 **Forum
Mediterraneo
in Sanità™ 2024**

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II livello

STATO DI ATTUAZIONE

E' stata effettuata una **GAP ANALYSIS**, tra lo stato iniziale del livello di digitalizzazione e il modello di previsione rispetto ai target PNRR, sono state eseguite le seguenti operazioni:

ASSESSMENT:

- Interviste presso Le Aziende Sanitarie
- Somministrazione di check-list
- Verifica e Validazione dei risultati



CONDIVISIONE dei risultati con la Regione Calabria



PROGRAMMAZIONE in funzione delle:

- Esigenze aziendali
- Delle azioni evolutive
- Gap tra livello iniziale e finale della digitalizzazione



FIRMA SCHEDA ATTIVITÀ tra

Le Aziende Sanitarie, Azienda Zero e la Regione Calabria.



PIANIFICAZIONE DEI FABBISOGNI

LOADING ...



18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



Forum Mediterraneo in Sanità™ 2024

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

1.1.1 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

OBIETTIVO PNRR (Target EU 🇪🇺)

7.700 Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva (3.500 posti letto di terapia intensiva e 4.200 posti letto di terapia semi-intensiva)



OBIETTIVO REGIONALE (Target REGIONE CALABRIA 🇮🇹)

- [134] PL TERAPIA INTENSIVA
- [136] PL TERAPIA SUB-INTENSIVA
- [17] INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PERCORSI PS su 16 stabilimenti

IMPORTO ASSEGNATO

Importo assegnato alla regione dal PNRR: € 51.171.973,00
Importo degli interventi a valere su risorse PNRR: € 51.171.973,00

OBIETTIVI REGIONALI

Programmazione					
Aziende	Presidi Ospedalieri	Posti letto TI	Posti letto T-SI	Interventi PS	Ambulanze
ASP CS	Castrovillari	8	8	1	3
	Rossano	6	10	1	
	Corigliano	---	---	1	
	Paola	4	---	1	
	Cetraro	---	8	1	
ASP KR	Crotone	3	8	1	---
ASP CZ	Lamezia Terme	6	8	1	3
	Soverato	---	---	2	
ASP VV	Vibo Valentia	6	3	1	---
ASPRC	Locri	8	4	1	3
	Polistena	6	6	1	
	Melito Porto Salvo	---	---	1	
	Gioia Tauro	---	---	1	
AO CS	"Annunziata" - Cosenza	34	28	1	---
AO CZ	"Pugliese" - Catanzaro	15	15	1	---
AOU CZ	"Policlinico Universitario" - Catanzaro	18	11	---	---
GOM RC	PO "Riuniti" - Reggio Calabria	20	27	1	---
Totale		134	136	17	9

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it



C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

1.1.1 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

CRONOPROGRAMMA			
MILESTONE & TARGET			
Milestone/Target	Descrizione	Termina di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	45% dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva	T4 2024	
Target	45% degli interventi di ristrutturazione dei percorsi PS	T4 2024	
Target	7700 Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva 3 500 posti letto di terapia intensiva e 4 200 posti letto di terapia semi-intensiva	T2 2026	
Target	Ospedali digitalizzati (DEA - Dipartimenti di Emergenza e di Ammissione - Livello I e II) - 451 interventi di ristrutturazione dei percorsi PS	T2 2026	

GANTT

Linee di attività	2022				2023				2024				2025				2026			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1 Completamento prima fase di interventi (45% dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva)																				
2 Completamento prima fase di interventi (45% degli interventi di ristrutturazione dei percorsi PS)																				
3 Completamento seconda fase di interventi (100% dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva)																				
4 Completamento seconda fase di interventi (100% degli interventi di ristrutturazione dei percorsi PS)																				
5 Completamento interventi di ristrutturazione dei percorsi PS																				
6 Attivazione dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva																				

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it

18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



Forum Mediterraneo in Sanità™ 2024

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
1.1.1 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

STATO DI ATTUAZIONE

Aziende	Presidi Ospedalieri	Posti letto TI	Posti letto T-SI	Interventi PS	Ambulanza
ASP CS	Castrovillari	Intervento ultimato - n.8 pl attivati	Progettazione ultimata - Intervento da rimodulare	Progettazione ultimata - Intervento da rimodulare	n. 3 ambulanze consegnate
	Rossano	Progettazione ultimata - Intervento da rimodulare	Progettazione ultimata - Intervento da rimodulare	Intervento in corso di esecuzione	
	Corigliano	-----	-----	Intervento ultimato	
	Paola	Intervento ultimato - n.4 pl attivati	-----	Intervento da rimodulare	
	Cetraro	-----	Progettazione ultimata - Intervento da rimodulare	Intervento da rimodulare	
ASP KR	Crotone	Intervento in corso di esecuzione	Intervento in corso di esecuzione	Intervento in corso di esecuzione	-----
ASP CZ	Lamezia Terme	Progettazione ultimata - Intervento in corso di rimodulazione	Progettazione ultimata - Intervento in corso di rimodulazione	Progettazione ultimata - Intervento in corso di rimodulazione	n. 3 ambulanze consegnate
	Soverato	-----	-----	Progettazione ultimata	
ASP VV	Vibo Valentia	Progettazione avviata - Intervento da rimodulare	Progettazione avviata - Intervento da rimodulare	Progettazione avviata - Intervento da rimodulare	-----
ASP RC	Locri	Progettazione in corso - intervento da rimodulare	Progettazione in corso - intervento da rimodulare	Progettazione in corso - intervento da rimodulare	n. 3 ambulanze in fase di consegna
	Polistena	Progettazione in corso - Intervento da rimodulare	Progettazione in corso - Intervento da rimodulare	Intervento in corso di rimodulazione	
	Melito Porto Salvo	-----	-----	Progettazione in corso - intervento da rimodulare	
	Gioia Tauro	-----	-----	Progettazione in corso - intervento da rimodulare	
AO CS	"Annunziata"- Cosenza	Intervento in corso di esecuzione	Intervento in corso di esecuzione	Intervento in corso di esecuzione	-----
AO CZ	"Pugliese"- Catanzaro	Intervento in corso di esecuzione n. 6 pl attivati	Intervento in corso di esecuzione	Intervento in corso di esecuzione	-----
AOU CZ	"Politecnico Universitario"- Catanzaro	Intervento in corso di esecuzione n. 6 pl attivati	Intervento in corso di esecuzione	-----	-----
GOM RC	PO "Riuniti" - Reggio Calabria	Intervento in corso di rimodulazione	Intervento in corso di rimodulazione	Intervento in corso di rimodulazione	-----

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk    

www.forummediterraneosanita.it

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET MINIMO REGIONALE	[286]
TARGET MASSIMO REGIONALE	[286]

FABBISOGNO Il fabbisogno dichiarato dalla Regione in termini di numerosità di apparecchiature, dettagliato per tipologia e per Ente del SSR. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun intervento è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

ENTE del SSR	TAC	RMN	ACC. LIN.	SIST. RAD.	ANG.	G.C.	MAMM.	G.C./TAC	PET/TAC	ECOT.	ULTR. APPAR.	Totale
ASP Cosenza	3	2	0	0	2	0	4	0	0	39	18	68
ASP Crotone	1	0	0	1	0	0	2	0	0	13	2	19
ASP Catanzaro	0	0	0	4	0	0	0	0	0	14	6	24
ASP Vibo Valentia	0	0	0	5	0	0	2	0	0	16	4	27
ASP Reggio Calabria	0	0	0	4	0	0	2	0	0	36	7	49
AD Cosenza	1	0	0	3	0	1	0	0	0	15	3	23
AD Catanzaro	2	0	1	2	1	0	1	0	0	10	4	21
ADU Catanzaro	0	0	0	2	0	0	0	0	0	10	4	16
GOM Reggio Calabria	2	0	0	5	0	0	1	0	0	29	2	39
Totale	9	2	1	26	3	1	12	0	0	182	50	286

TAC: Tomografia Assiale Computerizzata a 128 strati; RMN: Risonanza Magnetica Nucleare 1.5 T; Acc. Lin: Acceleratori Lineari; Sic. Rad: Sistema Radiologico Fisso; ANG: Angiografi; G.C.: Gamma Camera; Mamm.: Mammografi; PET: Tomografia a emissione di positroni; Ecot.: Ecotomografi.

IMPORTO ASSEGNATO Importo assegnato alla regione dal PNRR: 44.753.062,11€
Importo degli interventi a valere su risorse PNRR: € 44.753.062,00€

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk





www.forummediterraneosanita.it



C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature	T4 2022	
Target	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	T4 2024	

GANTT




Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk    

www.forummediterraneosanita.it

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie



PNRR - GRANDI APPARECCHIATURE MONITORAGGIO ATTUAZIONE 15 AGOSTO 2024					
ENTE del SSR	TIPOLOGIA	QUANTITA'	STATO ATTUAZIONE		
			N. ordinate	N. consegnate	N. collaudate
			A.O. MATER DOMINI CATANZARO	ECOTOMOGRAFI	10
	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	6	5	1	1
A.S.P. CATANZARO	ECOTOMOGRAFI	14	14	14	14
	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	10	4	0	0
A.S.P. COSENZA	ECOTOMOGRAFI	39	39	39	39
	ANGIOGRAFI	2	2	1	1
	MAMMOGRAFI	4	4	2	2
	RMN	2	2	0	0
	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	18	15	3	2
	TAC	3	3	0	0
A.S.P. CROTONE	ECOTOMOGRAFI	13	13	13	13
	MAMMOGRAFI	2	0	0	0
	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	3	2	0	0
	TAC	1	0	0	0

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it



C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie

A.S.P. CROTONE	ECOTOMOGRAFI	13	13	13	13
	MAMMOGRAFI	2	0	0	0
	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	3	2	0	0
	TAC	1	0	0	0
A.S.P. REGGIO CALABRIA	ECOTOMOGRAFI	36	36	36	36
	MAMMOGRAFI	2	2	0	0
	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	11	9	1	1
A.S.P. VIBO VALENTIA	ECOTOMOGRAFI	16	16	16	16
	MAMMOGRAFI	2	2	2	1
	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	9	7	5	5
AZIENDA OSP. BIANCHI-MELACRINO-MORELLI	ECOTOMOGRAFI	29	29	29	29
	MAMMOGRAFI	1	1	0	0
	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	7	6	0	0
	TAC	2	2	1	1
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	ECOTOMOGRAFI	15	15	15	15
	GAMMA CAMERE	1	1	0	0
	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	6	6	1	1
	TAC	1	1	0	0
AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE-CIACCIO	ECOTOMOGRAFI	10	10	10	10
	ACCELERATORI LINEARI	1	1	0	0
	ANGIOGRAFI	1	1	1	1
	MAMMOGRAFI	1	1	1	1
	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	6	4	0	0
TAC	2	2	0	0	
TOTALE		286	265	201	199

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk




www.forummediterraneosanita.it

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero


1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie

TIPOLOGIA	QUANTITA'	STATO ATTUAZIONE		
		N. ordinate	N. consegnate	N. collaudate
ECOTOMOGRAFI	182	182	182	182
GAMMA CAMERE	1	1	0	0
ACCELERATORI LINEARI	1	1	0	0
MAMMOGRAFI	12	10	5	4
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	76	58	11	10
ANGIOGRAFI	3	3	2	2
TAC	9	8	1	1
RMN	2	2	0	0
TOTALE	286	265	201	199

STATO DI ATTUAZIONE - PER TIPOLOGIA DI MACCHINARI

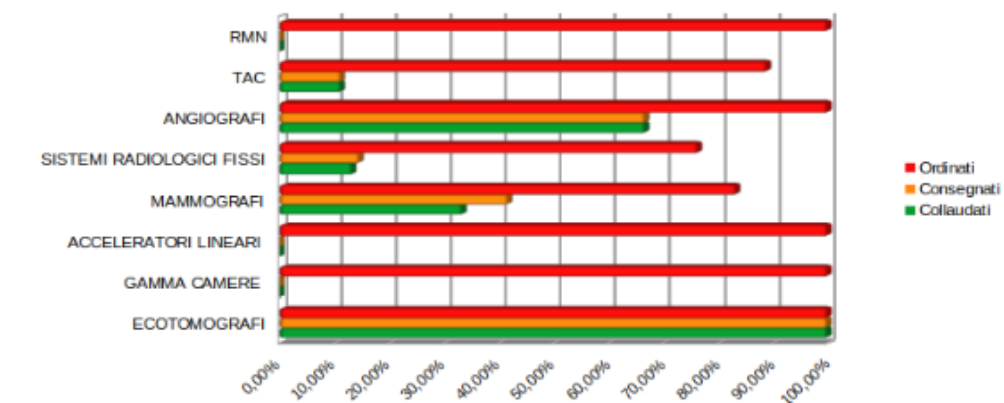

GRANDI APPARECCHIATURE - STATO ATTUAZIONE (Per azienda)

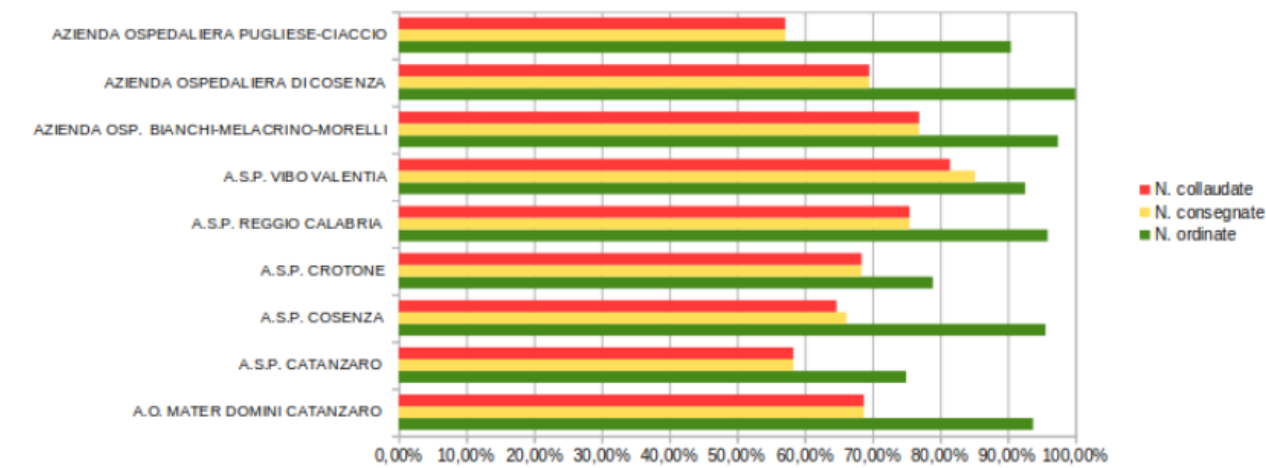

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it



18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



Forum Mediterraneo in Sanità™ 2024

C2 - 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNRR

OBIETTIVO PNRR (Target EU )
109 interventi strutturali

OBIETTIVO REGIONALE (Target REGIONE CALABRIA )
6 interventi strutturali

IMPORTO ASSEGNATO
Importo assegnato alla regione dal PNRR: € 24.042.738,10
Importo degli interventi a valere su risorse PNRR: € 24.042.738,00
Importo integrativo fonte di finanziamento GSE - Conto Termico: € 10.804.608,00

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET MINIMO REGIONALE [6 interventi]

TARGET MASSIMO REGIONALE [6 interventi]

FABBISOGNO
Il fabbisogno dichiarato dalla Regione Calabria in termini di numerosità di interventi, dettagliato per Ente del SSR e per stato di avanzamento del progetto. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun intervento è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

ENTE del SSR	Titolo intervento	Dati immobile		Interventi	
		Superficie	Posti letto	Cat. Zona sismica	Livello progettazione
ASP REGIONO CALABRIA	OSPEDALE GENERALE "GIOVANNI XXIII"	5800	65	1	STUDIO DI FATTIBILITÀ
GOM "BIANCHI-MELACRINO MORELLI" REGIONO CALABRIA	GOM "BIANCHI-MELACRINO MORELLI" REGIONO CALABRIA	4836	95	1	STUDIO DI FATTIBILITÀ
AD "ANNUNZIATA" COSENZA	AD "ANNUNZIATA" COSENZA	4594	29	1	PROGETTAZIONE DA AVVIARE
AD "PUGLIESE CIACCIO" CATANZARO	AD "PUGLIESE CIACCIO" CATANZARO	4500	33	2	PROGETTAZIONE DA AVVIARE
ASP VIBO VALENTIA	PO "IAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA	13500	163	1	PROGETTAZIONE DA AVVIARE
AD "PUGLIESE CIACCIO" CATANZARO	AD "PUGLIESE CIACCIO" CATANZARO	3200	0	2	PROGETTAZIONE DA AVVIARE

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it



C2 - 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNRR

CRONOPROGRAMMA			
MILESTONE & TARGET			
Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITALIAE
Milestone	Pubblicazione procedure di gara per interventi antisismici	T1 2023	
Target	Completamento degli interventi antisismici nelle strutture	T2 2026	

GANIT					
Linee di attività	2022	2023	2024	2025	2026
1 Pubblicazione delle procedure di gara per interventi antisismici					
2 Sottoscrizione dei contratti da parte della Regione					
3 Avviso dei lavori					
3.1 Verifica vulnerabilità sismica					
3.2 Progettazione					
3.3 Esecuzione dei lavori					
3.4 Collaudo					
4 Completamento degli interventi antisismici nelle strutture					

#	N. Piano	CUP	ENTE del SSR	UB/SPOKE	COMUNE	PROVINCIA	IMPORTO TOTALE €	Livello della progettazione consolidato al 15 - AGO - 2024	Stato contratto	Stato esecuzione lavori al 15 - AGO - 2024
1	412	F55F22000610001	AO COSENZA	PNRR	ROGLIANO	CS	2.664.520,00			
2	410	J65F22000500006	AO CATANZARO	PNRR	CATANZARO	CZ	2.031.632,00			
3	411	J65F22000510006	AO CATANZARO	PNRR	CATANZARO	CZ	1.478.654,00			
4	413	G35F22000470001	GOM REGGIO CALABRIA	PNRR	REGGIO DI CALABRIA	RC	3.868.800,00			
5	414	G55F21001390001	ASP REGGIO CALABRIA	PNRR	GIOIA TAURO	RC	3.194.525,00			
6	415	J45F22000370005	ASP VIBO VALENTIA	PNRR	VIBO VALENTIA	VV	21.609.215,00			

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it

18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



Forum Mediterraneo in Sanità™ 2024

C2 - 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Fondi PNC

OBIETTIVO PNRR (Target EU )
220 interventi strutturali

OBIETTIVO REGIONALE (Target REGIONE CALABRIA )
7 interventi strutturali

IMPORTO ASSEGNATO
Importo assegnato alla regione dal PNC: € 54.569.791,21
Importo degli interventi a valere su risorse PNRR: € 54.569.789,00

Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNC)							
CUP	ENTE DEL SSR (Inserire Regione/PP.A.A.)	Presidio Ospedaliero	Comune	Provincia	Indirizzo	IMPORTO INTERVENTO PNC	IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)
F85F22001470001	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: ESPOSITO GIULIANO	VECCHIO FLESSO 2839	COSENZA	COSENZA	FELICE MIGLIORI .SNC	23.328.780,00	0,00
012C22000180001	A.S.P. COSENZA - RUP: ABATE GIANFRANCO	Ospedale Sicuro e Sostenibile Ospedale Civile di PRAMA A MARE	PRAMA A MARE	COSENZA	Località S. Stefano -2	5.665.400,00	0,00
052C22000160001	A.S.P. COSENZA - RUP: ABATE GIANFRANCO	Ospedale Sicuro e Sostenibile OSPEDALE CIVILE "G. CHICHINNO" DI TRIBASSACCE	TRIBASSACCE	COSENZA	VIA PIERRE E MARIE CURIE .snc	2.091.150,00	0,00
012C22000170001	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	Presidio Ospedaliero di San Giovanni in Fiore	SAN GIOVANNI IN FIORE	COSENZA	Via Garibaldi .snc	5.638.200,00	0,00
085F22000580006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME (POLTI)	LAMEZIA TERME	CATANZARO	ARTURO PERUGINI .SNC	28.282.410,00	0,00
E35F22000460006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	PRESIDIO OSPEDALIERO SOVRABATO (PONDI)	SOVRABATO	CATANZARO	DE' CARDONA .SRL	5.095.260,00	0,00
F88122000540001	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: FRUGIUELE CARLO	Edificio Malattie Infettive	COSENZA	COSENZA	della Repubblica .snc	2.358.202,00	0,00

2022

Sottoscrizione CIS:

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'attuazione del Piano Operativo Regionale della Calabria – PNRR - M6 Salute, sottoscritto in data 30/05/2022 tra il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria – Commissario ad acta per il Piano di Rientro, prevede, tra l'altro, a valere sulla Componente 2 - Investimento 1.2 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile" - fondi PNC, la realizzazione di n. 7 interventi per un importo complessivo pari a € 54.569.791,21;

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it

18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI

 **Forum
Mediterraneo
in Sanità™ 2024**

C2 - 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNC

l'art. 1, comma 13 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56 ha stabilito, tra l'altro, che *“Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.*

Aprile
2024

La norma di cui trattasi non ha considerato le priorità della programmazione degli investimenti ex art. 20 Legge 67/88 già formalizzate dalla regione Calabria;

C2 - 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNC




Con nota prot. n. 381364 del 07/06/2024, il Commissario ad acta, a seguito di una puntuale verifica della situazione dei singoli interventi circa la sottoscrizione di obblighi giuridicamente vincolanti, ha comunicato alle Aziende interessate che:

Giugno
2024

- gli interventi per i quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'esecuzione dei relativi lavori, sono da ritenersi **definanziati per la quota parte afferente ai lavori** stessi e pertanto nessun atto relativo alla realizzazione dei medesimi potrà essere sottoscritto;
- per tali interventi le stesse Aziende dovranno procedere al completamento delle attività di progettazione previste nei contratti ad oggi stipulati, alla verifica e alla successiva approvazione;
- con successivi provvedimenti commissariali verranno dettate disposizioni in ordine alle fonti di copertura finanziaria delle relative spese per la fase di progettazione;
- **che per l'intervento relativo all'Edificio Malattie Infettive del P.O. Annunziata di Cosenza** (CUP: F88122000540001) di importo pari a 3.558.201,00, per il quale sono state già sottoscritte obbligazioni giuridicamente vincolanti per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai fini di non generare contenziosi con il fornitore, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza dovrà procedere all'attuazione dell'intervento a valere su risorse ex art. 20 della legge 67/88;

DCA 141 del 17/06/2024:
«Programmazione delle risorse residue afferenti al programma di investimenti ex art. 20, L. n. 67/1988. Modifiche ed integrazioni al DCA n. 163 del 28/11/2022 e al DCA n. 84 del 05/04/2024. Atto di indirizzo.»

C2 - 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile
Fondi PNC

#	N. Piano	CUP	ENTE del SSR	UB/SPOKE	COMUNE	Prov.	IMPORTO TOTALE €	Livello della progettazione consolidato al 15 - AGO - 2024	Stato contratto	Stato esecuzione lavori al 15 - AGO - 2024
1	416	E85F22000580006	ASP CATANZARO	PNC	LAMEZIA TERME	CZ	18.192.410,00	DEFINANZIATO	-----	----
2	417	E35F22000450006	ASP CATANZARO	PNC	SOVERATO	CZ	5.095.268,00	DEFINANZIATO	-----	----
3	418	F85F22001470001	AO COSENZA	PNC	COSENZA	CS	15.335.780,00	DEFINANZIATO	-----	----
4	419	F88122000540001	AO COSENZA	PNC	COSENZA	CS	3.558.201,00			
5	420	B12C22000180001	ASP COSENZA	PNC	PRAIA A MARE	CS	5.665.400,00	DEFINANZIATO	-----	----
6	421	B12C22000170001	ASP COSENZA	PNC	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	5.638.280,00	DEFINANZIATO	-----	----
7	422	B52C22000160001	ASP COSENZA	PNC	TREBISACCE	CS	1.084.450,00	DEFINANZIATO	-----	----

C2 - 1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione


1.3.1 Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni



OBIETTIVO PNRR (Target EU)
 85% dei medici di base alimentano il Fascicolo Sanitario Elettronico
 21 Regioni/Province autonome hanno adottato e utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico

OBIETTIVO REGIONALE (Target REGIONE CALABRIA)
 85% dei medici di base alimentano il Fascicolo Sanitario Elettronico
 Adozione, alimentazione e utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico

IMPORTO COMPLESSIVO A LIVELLO NAZIONALE

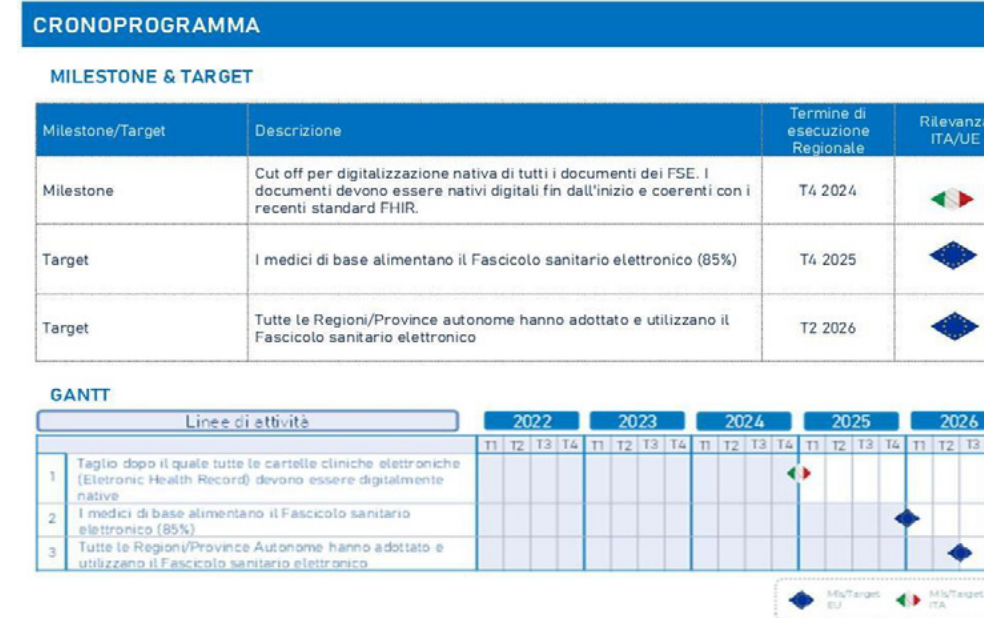

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it



18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



Forum Mediterraneo in Sanità™ 2024

C2 - 1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione

1.3.2 Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali

OBIETTIVI REGIONALI

OBIETTIVO PNRR (Target EU)
4 nuovi flussi informativi nazionali




OBIETTIVO REGIONALE (Target REGIONE CALABRIA)
4 nuovi flussi informativi (riabilitazione territoriale, consultori familiari, ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria)

IMPORTO ASSEGNATO
Importo assegnato alla Regione Calabria: € 1.140.320,46

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regione	Avanzamento
Target	Rinegoerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NISIS) a livello locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) - Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: riabilitazione territoriale e consultori familiari	11/2023	▶
Target	Rinegoerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NISIS) a livello locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) - Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria	11/2025	▶

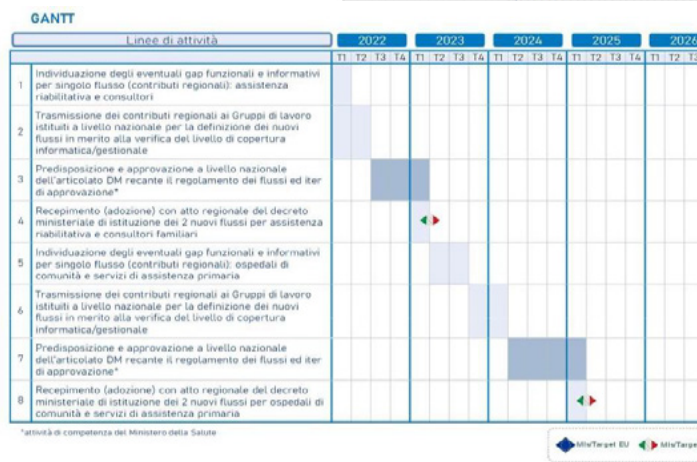

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it




18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI

**Forum
Mediterraneo
in Sanità™ 2024**

C2 - 1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione

1.3.2 Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali

STATO DI ATTUAZIONE al 2023

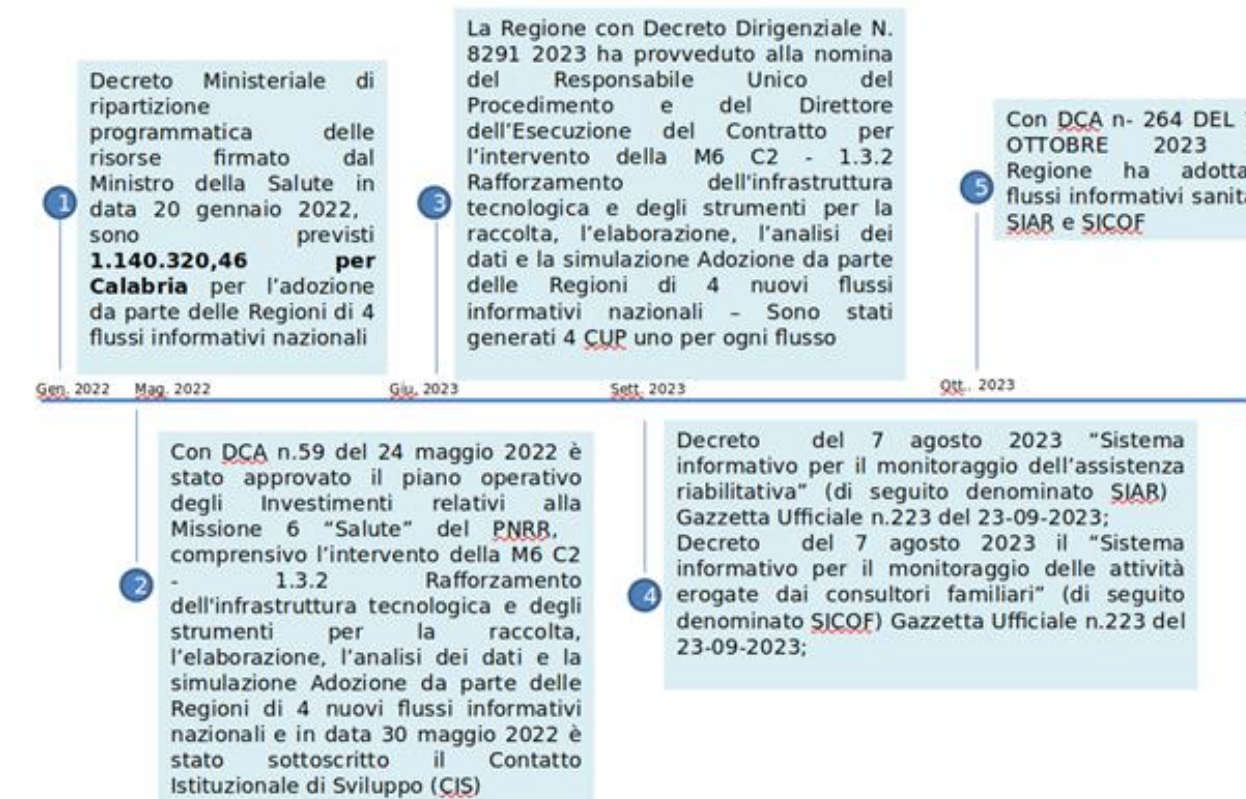

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it



18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



**C2 - 1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per
la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione**

1.3.2 Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali

STATO DI ATTUAZIONE

Settembre 2024: Fase di nomina del Collaudatore per la verifica di conformità del servizio inerente lo sviluppo dei flussi informatici SIAR e SICOF

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it



C2 - 2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Borse aggiuntive in formazione di medicina generale

OBIETTIVI

OBIETTIVO PNRR (Target EU )








Assegnazione di 2.700 borse di studio per la formazione specifica in medicina generale

OBIETTIVO REGIONALE (Target REGIONE CALABRIA )

Definito con Decreto del Ministero della Salute (34)

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Riferimento ITA/UE
Target	Assegnazione di 900 borse aggiuntive per il Corso di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio formativo 2021-2024	T2 2022	
Milestone	Pubblicazione del decreto annuale di assegnazione risorse economiche per finanziare 900 borse di studio per i Medici di Medicina Generale	T4 2022	
Target	Assegnazione di 1800 borse aggiuntive per il Corso di formazione specifica in Medicina Generale per i trienni formativi 2021-2024 e 2022-2025	T2 2023	
Milestone	Pubblicazione del decreto annuale di assegnazione risorse economiche per finanziare 900 borse di studio per i Medici di Medicina Generale	T4 2023	
Target	Assegnazione di 2700 borse aggiuntive per il Corso di formazione specifica in Medicina Generale per i trienni formativi 2021-2024, 2022-2025 e 2023-2026	T2 2024	

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it


18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



Forum Mediterraneo in Sanità™ 2024

C2 - 2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Borse aggiuntive in formazione di medicina generale

CRONOPROGRAMMA

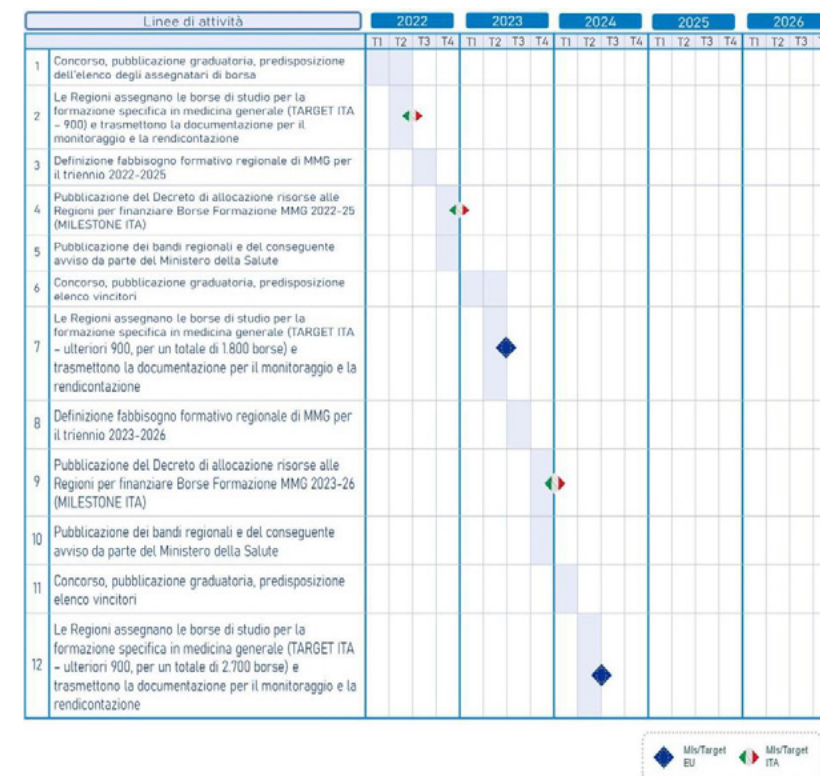

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it



18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI

 **Forum
Mediterraneo
in Sanità™ 2024**

C2 - 2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Borse aggiuntive in formazione di medicina generale

STATO DI ATTUAZIONE

Sono stati forniti all'UMPNNRR i dati relativi ai libretti accademici e ai cedolini mensili disponibili al [29/05/2024](#), nell'ambito degli adempimenti funzionali a comprovare il raggiungimento del Target europeo M6C2-15, concernente l'assegnazione di ulteriori 900 borse di studio per corsi specifici di medicina generale, in scadenza a **T2 2024**, secondo gli obblighi assunti nel CIS.

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it

18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



C2 - 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario- Corso di formazione in infezioni ospedaliere

OBIETTIVI





- OBIETTIVO PNRR (Target EU )
293.386 partecipanti
- OBIETTIVO REGIONALE (Target REGIONE CALABRIA )
11.707 partecipanti

IMPORTO ASSEGNATO

Importo assegnato alla regione dal PNRR: € 3.193.404,38

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/EU
Milestone	Completamento procedure di selezione dei provider	T1 2023	
Milestone	Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere	T3 2024	
Target	Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere	T1 2025	
Milestone	Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere	T4 2025	
Target	Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere	T2 2026	

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it



C2 - 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario- Corso di formazione in infezioni ospedaliere

CRONOPROGRAMMA

Linee di attività	2022				2023				2024				2025				2026			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1 Procedura di selezione dei provider da parte delle Regioni																				
2 Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere - Milestone (ITA)												▶								
3 Numero di dipendenti formati nel campo delle infezioni ospedaliere (150.000) - Target (ITA)												▶								
4 Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere - Milestone (ITA)																▶				
5 Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere (293.386) - Target (ITA)																				▶



Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk    

www.forummediterraneosanita.it

18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



C2 - 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario- Corso di formazione in infezioni ospedaliere

STATO DI ATTUAZIONE

Tra **Novembre 2023** e **Gennaio 2024**: Sottoscrizione dei contratti di servizio con ISS per la fruizione del modulo A per ASP Catanzaro, ASP Cosenza, ASP Crotona, ASP Vibo Valentia, ASP Reggio Calabria, GOM Reggio Calabria, AOU Catanzaro;

-Apertura della fruizione del Modulo A sulla piattaforma EDUISS in data **15/02/2024**;

- AO Cosenza ha provveduto autonomamente all'erogazione del Modulo A in diverse sessioni e del Modulo B.

18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



18-19-20 SETTEMBRE 2024
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI



Si ringrazia per l'attenzione

Ing. Francesco Tarsia- Referente Unico PNRR M6-Regione Calabria

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it



Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

[Torna all'inizio](#)
